


ID	СМР	Ед. Мярка	Колич.	Днев. прои.	Продл.	Начало	Краи	Последователност	Материали	Ресурси
1	Дейности по изграждане , ремонт и поддържане на улична мрежа и общински пътища в община Златоград				7 days	Mon 02.09.19	Sun 08.09.19			
2	Обособена позиция №3 " Общински път /Цацаровци - Златоград/- с. Ерма рела - мах. Марзян"				7 days	Mon 02.09.19	Sun 08.09.19			
3	Получаване на писмено известие от Възложителя за започване изпълнението на обекта.					Mon 02.09.19	Mon 02.09.19			
4	Временно строителство, мобилизация на строителна техника и оборудване				1 day	Mon 02.09.19	Mon 02.09.19	3		
5	Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/	т	800,00	300	3 days	Thu 05.09.19	Sat 07.09.19	6SS	Асфалтобетон плътна смес	Асфалтополагача машина ;Валяк пневматичен ;Валяк 10т;Валяк 2 т;Работник [4]
6	Полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и биндер, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,	м2	8000,0	4500	2 days	Thu 05.09.19	Fri 06.09.19	9	Битумна емулсия	Работник ;Метачна машина ;Гудронатор;Водоносна машина
7	Превоз плътна и не плътна асфалтова смес	т/км	7045,0	7045	3 days	Thu 05.09.19	Sat 07.09.19	5SS		Самосвал
8	Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртане на асфалтова настилка, обдухване и обливане с битумна емулсия	м2	173,00	173	1 day	Tue 03.09.19	Tue 03.09.19	4	Битумна емулсия	Фугорез;Компресор ;Работник [2]
9	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес/в т.ч. полагане на битумен разлив и уплътняване с вибрационен валяк или с виброплоча и доставка на асфалтова смес/	т	20,80	30	1 day	Wed 04.09.19	Wed 04.09.19	8	Асфалтобетон плътна смес; Битумна емулсия	Асфалтополагача машина ;Валяк ;Работник [4]
10	Превоз строителни отпадъци до 20км	м3	2,00	2	1 day	Tue 03.09.19	Tue 03.09.19	8SS		Самосвал
11	Доставка и монтаж армировъчна мрежа ф8 - 20/20	м2	200,00	200	2 days	Tue 03.09.19	Wed 04.09.19	4	Арматурна мрежа	Бордови автомобил ;Работник [3]
12	Полагане на бетон С20/25 - В25 по БДС-EN206-1:2000 и EN206-1/NA	м3	20,00	15	2 days	Tue 03.09.19	Wed 04.09.19	13SS	Бетон	Бетоновоз;Работник [3]
13	Превоз на бетон до обекта	м3	20,00	20	2 days	Tue 03.09.19	Wed 04.09.19	11SS		Бетоновоз
14	Предаване обекта на Възложителя. Демобилизация				1 day	Sun 08.09.19	Sun 08.09.19	5		



000048

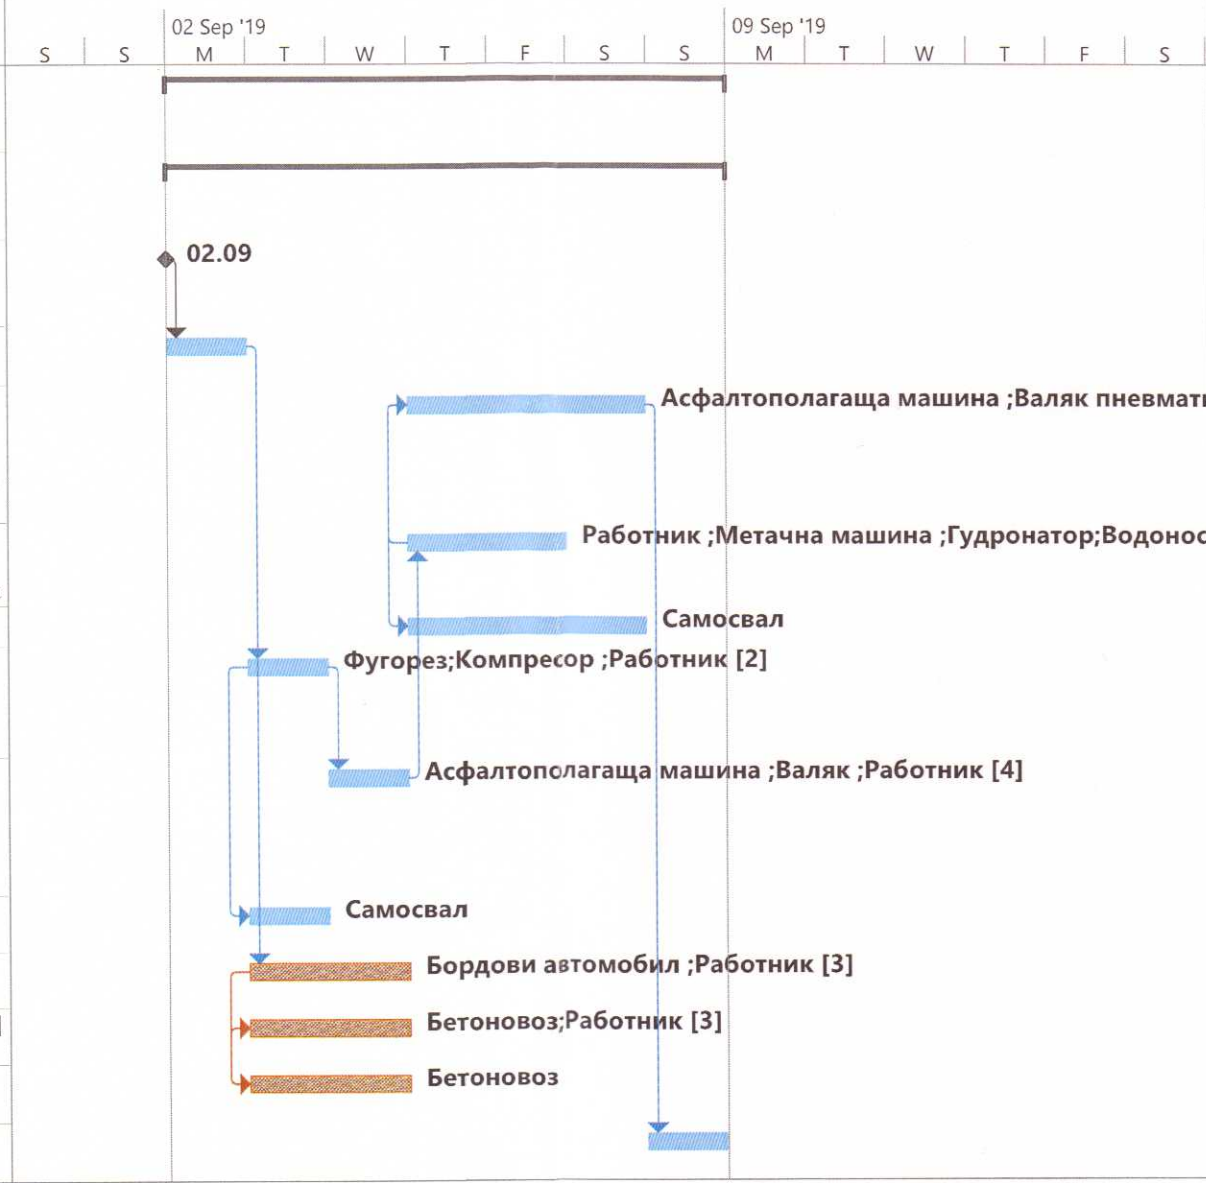

Handwritten signatures and initials in blue ink.
